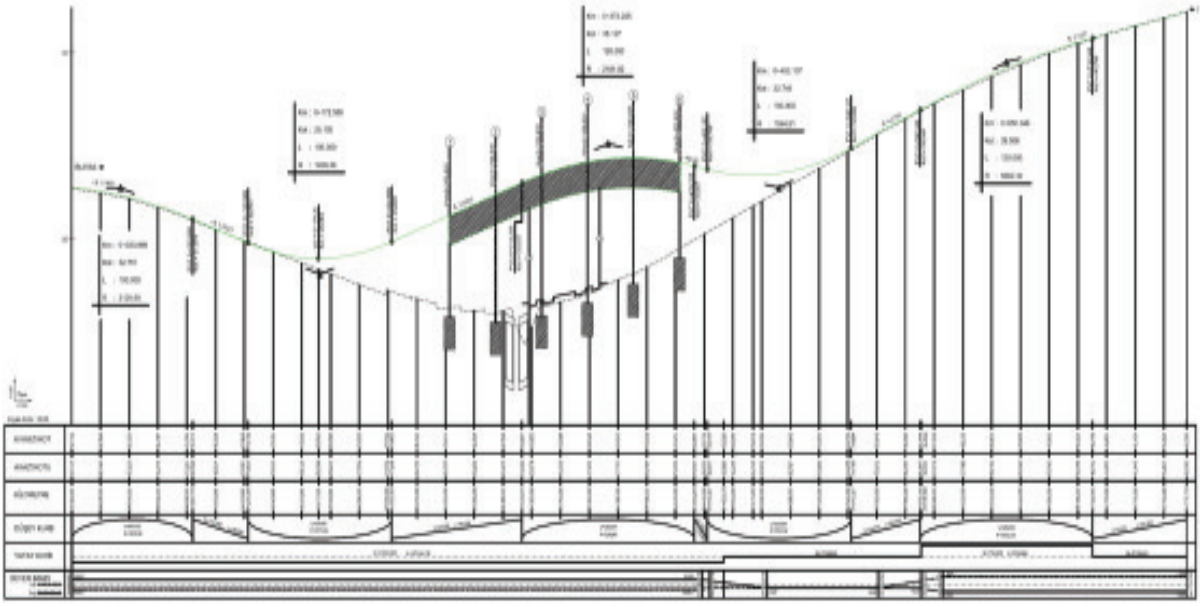İşveren	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
İşin Süresi	18.12.2009 - 29.01.2010
Hizmetler	B-5 Değirmendere 5 açıklıklı Kavşak Köprüsünün 7 açıklıklı olarak hesap raporlarının hazırlanması ve revize edilmesi Mevcut projelerinin tasnifi ve kontrolü Sanat yapıları uygulama projelerinin hazırlanması Hidrolik ve hidrolojik etütler yapılarak drenaj projelerinin hazırlanması Aydınlatma projelerinin hazırlanması Projelerin tümünün KGM onayının alınması Metraj ve ihale dokümanlarının hazırlanması
Teknik Bilgi	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kent İçi Ulaşım ve Trafik Planı, Ulaşım ve İyileştirme Etüt ve Projelerinin hazırlanması işi kapsamında, B-5 Değirmendere Giriş Kavşağı uygulama kavşak projesinde değişiklik yapılması kapsamında imar ve kadastral planlar, proje sahasında bulunan tüm altyapı verileri, hazırlanmış olan uygulama projeleri, halihazır harita, zemin etüt raporlarına uyulmak koşuluyla B-5 Değirmendere 5 açıklıklı Kavşak Köprüsünün başlangıç ve bitişine birer adet açıklık eklenerek, 7 açıklıklı olarak köprünün hesap raporlarının, köprü ve kavşak projelerinin revize edilmesi
